

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Semayu – Kertek Km. 03 Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361**

Wonosobo, 25 Maret 2022

Nomor : 143/01/TPK/2022
Lampiran : -
Perihal : **Permintaan Pemeriksaan
Hasil Pembangunan Kegiatan Fisik**

K e p a d a :

Yth. Tim Pengawas Kegiatan
Desa Semayu
di-


T E M P A T

Sehubungan dengan telah diselesaikannya kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan di Desa Semayu senilai Rp 70.000.000,- oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semayu, dengan ini dimintakan untuk kiranya dapat dilakukan proses penilaian/ pemeriksaan / pengujian dan penerimaan terhadap hasil pekerjaan *Pembangunan Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan Desa Semayu.*

Selanjutnya hasil pekerjaan Saudara tersebut kiranya dapat dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengawasan Pekerjaan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Pelaksana Kegiatan
Anggaran



MUNIF SUSANTO





PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA SEMAYU

Jl. Kertek-Selomerto Km. 03 Semayu Kode Pos 56361 email : pemdessemayu@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
NOMOR : 143/01/2022

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : LUKITO AJI
Jabatan : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Semayu
Alamat : Semayu RT 02 RW 01

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. N a m a : MUNIF SUSANTO
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Anggaran
Alamat : Semayu RT 04 RW 02

Yang selanjut nya disebut sebagai PIHAK KEDUA


Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan Desa Semayu dengan nilai pekerjaan Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) telah selesai 100%.

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 143/01/2022 tanggal 28 Maret 2022 maka dengan ini menyatakan sebagai berikut:


1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU menerima penyerahan hasil pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

Yang Menyerahkan :
PIHAK KEDUA
Pelaksana Kegiatan Anggaran
Desa Semayu,


MUNIF SUSANTO

Yang Menerima :
PIHAK KESATU
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa,


LUKITO AJI

PERHITUNGAN OPNAM HASIL PEKERJAAN

PEKERJAAN
LOKASI
SUMBER ANGGARAN
DESA

PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI SASINAN
DUSUN SEMAYU JURANG
DANA DESA TA 2022
SEMAYU

No	Uraian	Rencana					Realisasi					Tambah / Kurang	Harga Satuan (Rp)	Selisih Harga (Rp)
		Panjang	Lebar	Tinggi	Jumlah	Volume	Panjang	Lebar	Tinggi	Jumlah	Volume			
I	Pekerjaan Tanah													
1	Menggali 1 m3 tanah lumpur sedalam 1 m	22,00	0,35	0,75	1,00	5,78	22,00	0,35	0,75	1,00	5,78			
		43,00	0,35	0,75	1,00	11,29	50,00	0,35	0,75	1,00	13,13			
		73,50	0,35	0,75	1,00	19,29	76,00	0,35	0,75	1,00	19,95			
						36,36					38,85	2,49	84.000,00	209.475,00
2	Pengurangan 1 m3 sirtu padat	22,00	1,40	0,10	1,00	3,08	22,00	1,40	0,08	1,00	2,46			
		43,00	1,40	0,10	1,00	6,02	50,00	1,40	0,08	1,00	5,60			
						9,10					8,06	-1,04	378.760,00	- 392.395,36
3	Pengurangan 1 m3 dengan tanah urug	22,00	1,40	0,30	1,00	9,24	22,00	1,40	0,30	1,00	9,24	0,00	94.590,00	-
4	Pengurangan 1 m3 dengan pasir urug	22,00	0,35	0,05	1,00	0,39	22,00	0,35	0,05	1,00	0,39			
		43,00	0,35	0,05	1,00	0,75	50,00	0,35	0,05	1,00	0,88			
		73,50	0,35	0,05	1,00	1,29	76,00	0,35	0,05	1,00	1,33			
						2,42					2,59	0,17	388.950,00	64.662,94
II	Pekerjaan Pasangan													
1	Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping)	22,00	0,35	0,20	1,00	1,54	22,00	0,35	0,20	1,00	1,54			
		22,00	0,20	0,20	1,00	0,88	22,00	0,20	0,20	1,00	0,88			
		43,00	0,35	0,20	1,00	3,01	50,00	0,35	0,20	1,00	3,50			
		73,50	0,35	0,20	1,00	5,15	76,00	0,35	0,20	1,00	5,32			
						10,58					11,24	0,67	589.137,00	391.776,11
2	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP	22,00	0,35	0,50	1,00	3,85	22,00	0,35	0,50	1,00	3,85			
		22,00	0,33	0,40	1,00	2,86	22,00	0,33	0,40	1,00	2,86			
		22,00	0,35	0,60	1,00	4,62	22,00	0,35	0,60	1,00	4,62			
		43,00	0,35	0,50	1,00	7,53	50,00	0,35	0,40	1,00	7,00			
		43,00	0,33	0,30	1,00	4,19	50,00	0,33	0,30	1,00	4,88			
		73,50	0,35	0,50	1,00	12,86	76,00	0,35	0,50	1,00	13,30			
		73,50	0,33	0,40	1,00	9,56	76,00	0,33	0,40	1,00	9,88			
						45,47					46,39	0,92	931.768,60	857.227,11
III	Pekerjaan Finishing													
1	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm	22,00	0,46		2,00	20,24	22,00	0,46		2,00	20,24			
		43,00	0,46		1,00	19,78	50,00	0,46		1,00	23,00			
		73,50	0,46		1,00	33,81	76,00	0,46		1,00	34,96			
						73,83					78,20	4,37	50.555,64	220.928,15

2	Pemasangan 1 m2 acian.	22,00	0,46		2,00	20,24	22,00	0,46		2,00	20,24			
		43,00	0,46		1,00	19,78	50,00	0,46		1,00	23,00			
		73,50	0,46		1,00	33,81	76,00	0,46		1,00	34,96			
						73,83					78,20	4,37	27.098,50	118.420,45
3	Pipa sulingan PVC AW 2"	0,40			132,00	52,80	0,40			44,00	17,60			
		0,40			86,00	34,40	0,40			100,00	40,00			
		0,40			147,00	58,80	0,40			152,00	60,80			
						146,00					118,40			
						37,00					30,00	-7,00	111.500,00	- 780.500,00
											Surplus	689.594,39		


Selomerto,

2022



(Bambang Setiadi, ST)

PRASASTI DAN PAPAN NAMA KEGIATAN

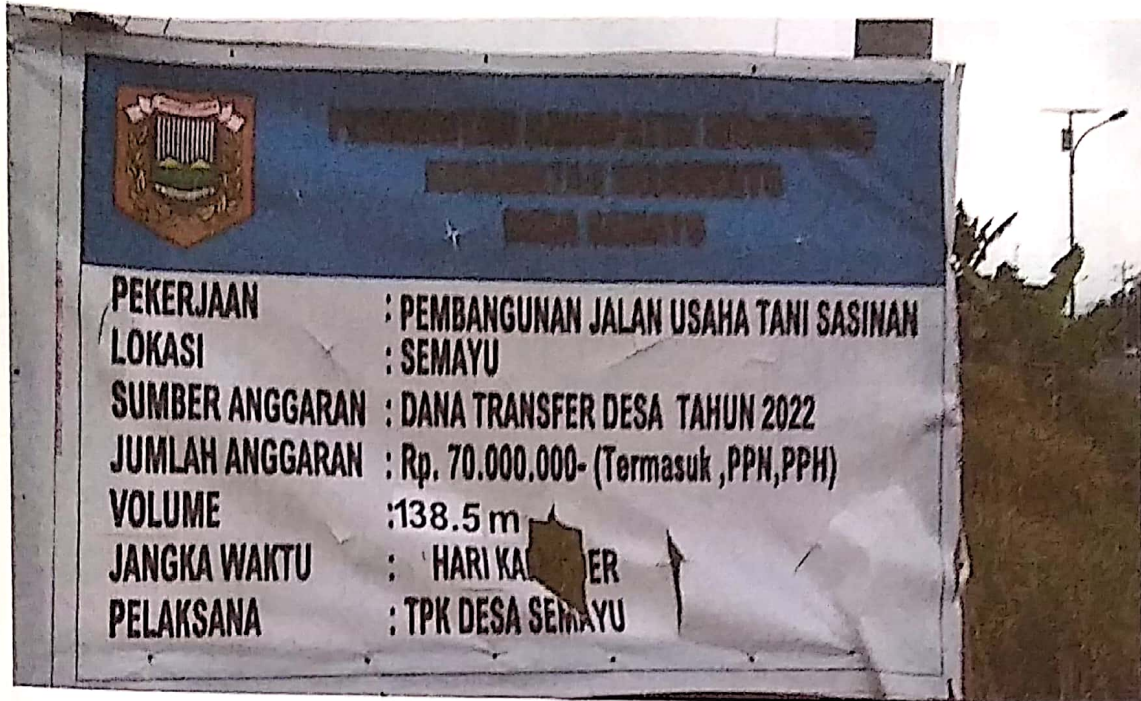

PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI SASINAN



0%



50%



100%
